AB Gullfoss
Tagrenovering/ Mek. udsugning

Detailtidsplan

Dato: 2009-11-10

ID	Task Name
1	**Etape 1 (6 opgange)**
2	Lofter + dørsprække I lejligheder
3	Væg + loft I ventilatonsrum
4	Ny afkastbund + afløb på faldstamme
5	Tilkobling af ventilationsanlæg
6	Kontrol af ventilationsanlæg
7	Isolering af kanaler + afkast
8	**Etape 2 (3 opgange)**
9	Væg + loft I ventilationsrum
10	Ny afkastbund + afløb på faldstamme
11	Tilkobling af ventilationsanlæg
12	Kontrol af ventilationsanlæg
13	Isolering af kanaler + afkast
14	**Etape 3 (6 opgange)**
15	Nedrivning af kanaler på tagetage
16	Lukning af undertag v. tudsten
17	Væg + loft I ventilationsrum
18	Nye kanaler på tagetage
19	Kontrol af kanaler
20	Tilkobling af ventilationsanlæg
21	Isolering af kanaler på tagetage
22	Rensning af betonkanaler
23	Lofter + dørsprække I lejligheder
24	Indbygning af afkast I tag
25	Lukning af tag
26	Kontrol af tag
27	Stillads flytning til etape 6
28	
29	**Etape 4 & 5 (6 opgange)**
30	Adgangsvej gennem tag (4)
31	Adgangsvej gennem tag (5)
32	Nedrivning af kanaler på tagetage
33	Lukning af undertag v. tudsten
34	Væg + loft I ventilationsrum
35	Nye kanaler på tagetage
36	Kontrol af kanaler
37	Isolering af kanaler på tagetage
38	Tilkobling af ventilationsanlæg
39	Rensning af betonkanaler
40	Lofter + dørsprække I lejligheder
41	Indbygning af afkast I tag
42	Lukning af tag
43	Kontrol af tag
44	Stillads flytning til etape 7
45	
46	**Etape 6 (4 opgange)**
47	Adgangsvej gennem tag
48	Tilpasning af lofter I WC/bad
49	Væg + loft I ventilationsrum
50	Nedrivning af kanaler på tagetage
51	Lukning af undertag v. tudsten
52	Rensning af betonkanaler
53	Nye kanaler på tagetage
54	Kontrol af kanaler
55	Isolering af kanaler på tagetage
56	Lofter + dørsprække I lejligheder
57	Indbygning af afkast I tag
58	Lukning af tag
59	Kontrol af tag
60	Stillads ned og hjem
61	
62	**Etape 7 (4 opgange)**
63	Adgangsvej gennem tag
64	Tilpasning af lofter I WC/bad
65	Væg + loft I ventilationsrum
66	Nedrivning af kanaler på tagetage
67	Lukning af undertag v. tudsten
68	Rensning af betonkanaler
69	Nye kanaler på tagetage
70	Kontrol af kanaler
71	Isolering af kanaler på tagetage
72	Lofter + dørsprække I lejligheder
73	Indbygning af afkast I tag
74	Lukning af tag
75	Kontrol af tag
76	Stillads ned og hjem

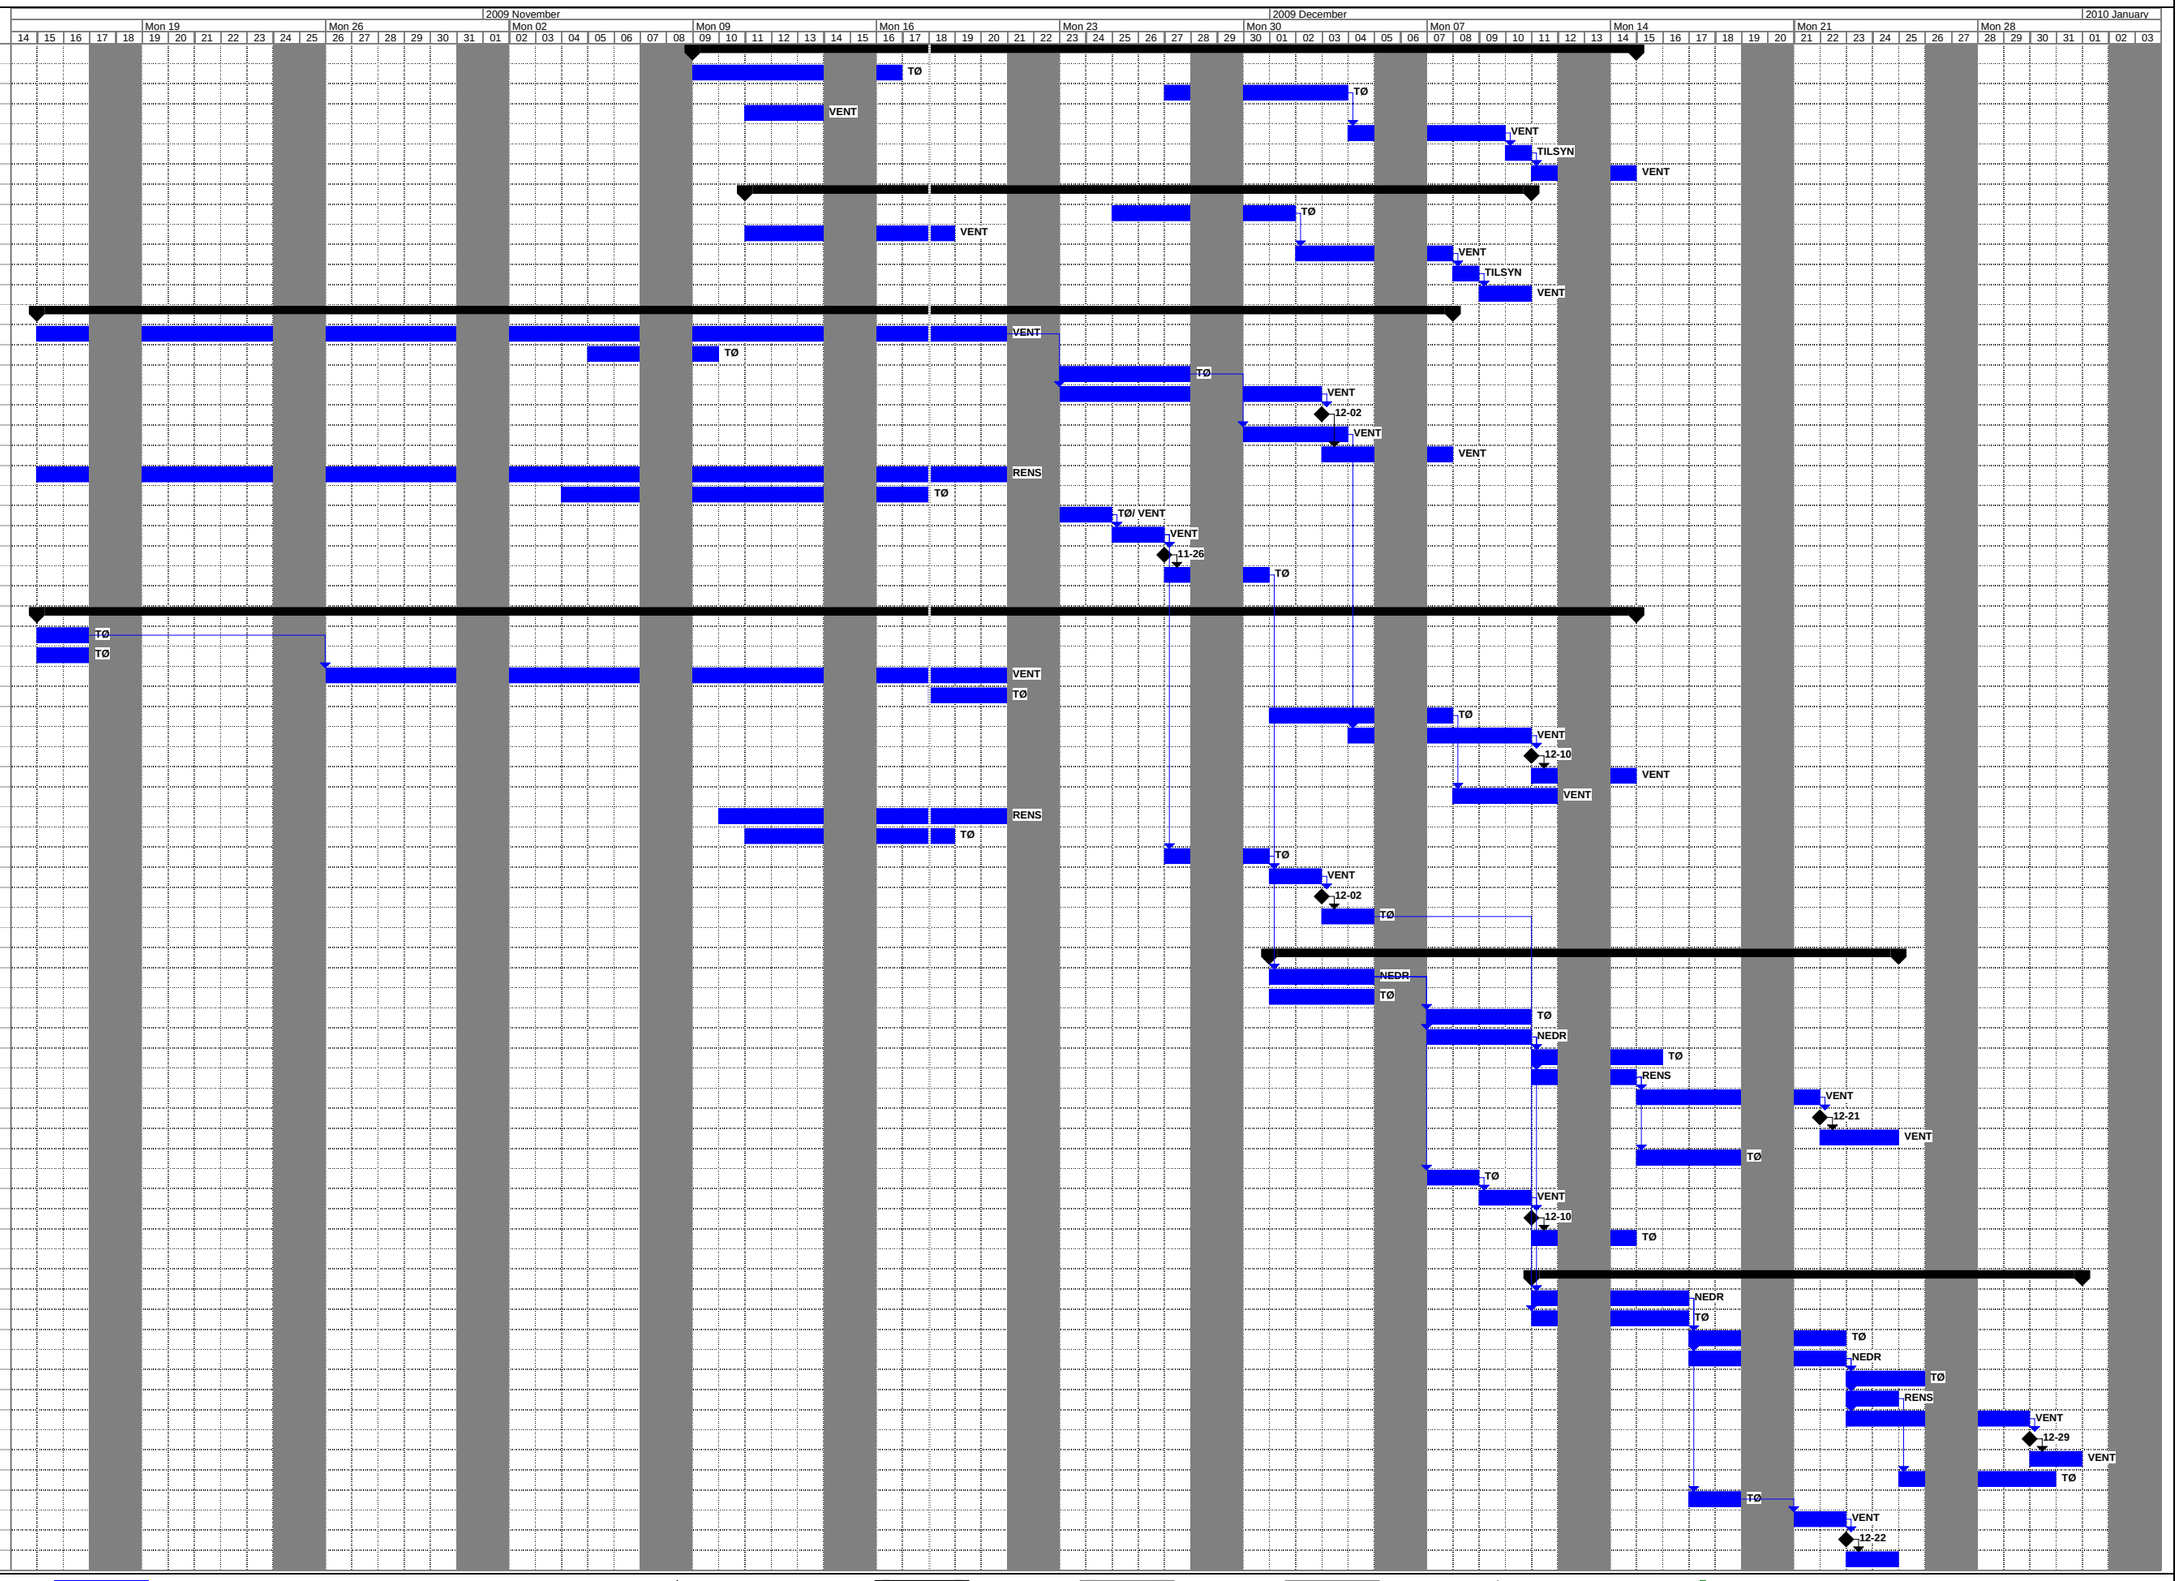

Project: Gullfoss Detail 18.11.09
Date: Wed 09-11-18

Task | Split | Progress | Milestone | Summary | Project Summary | External Tasks | External Milestone | Deadline
